

南部中核拠点の整備状況について

令和8年2月25日
奈良県防災統括室

1. 南部中核拠点(先行整備)について

- 南部中核拠点整備基本計画に基づき、段階的に南部中核拠点を整備を進めているところ。
- 第1段階である先行整備については、令和7年12月に工事着手し、**令和8年3月に整備完了予定**。

■ 南部中核拠点の段階的な整備

第1段階:先行整備



ヘリパッドと通路を先行整備し、
早期に防災機能の効果発現を図る

第2段階:コアゾーンの整備

南部中核拠点の核となるコアゾーンとして、
防災拠点となる施設および消防学校の整備を進め、
防災機能を向上させる

第3段階:支援ゾーンの整備

近隣府県等の応援部隊を受け入れる
ベースキャンプと外周道路等を整備して
更に防災機能を向上させる

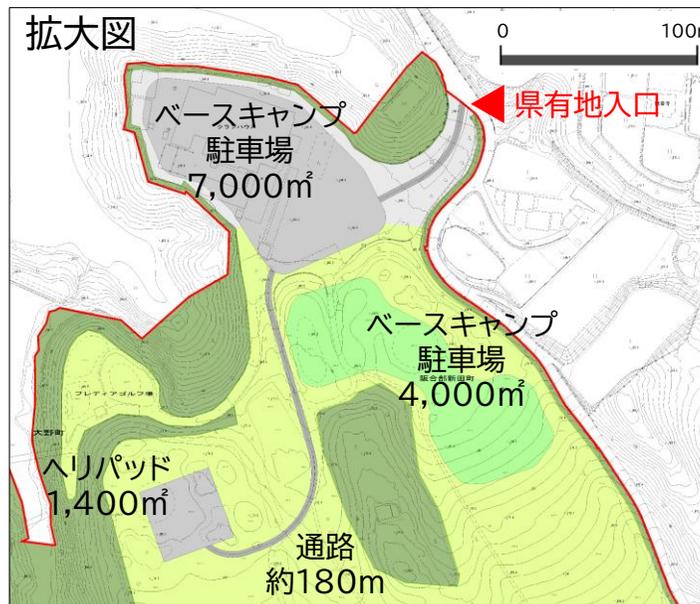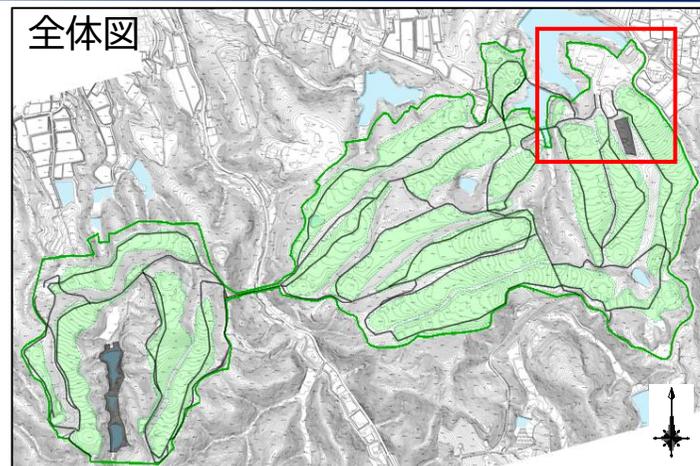

2. 先行整備の進捗状況（令和7年11月24日時点：着工前）



2. 先行整備の進捗状況（令和8年1月4日時点）



2. 先行整備の進捗状況（令和8年1月27日時点）



2. 先行整備の進捗状況（令和8年2月10日時点）



2. 先行整備の進捗状況（令和8年2月24日時点）



3. 今後の予定

1. 先行整備エリア

発災時、ヘリパッド及びベースキャンプ・駐車場をヘリの離着陸や応援部隊の活動拠点として、円滑に運用するため以下を実施


- 資機材(航空灯火等)の整備
- 訓練の実施

2. コアゾーン整備

コアゾーン整備に向け、必要となる以下の調査・設計を実施


- 流域及び流路の調査
- 水質の調査
- 南部中核拠点へ至るアクセス経路の改善のための、測量・調査・設計

4. 第2段階：コアゾーン整備イメージ

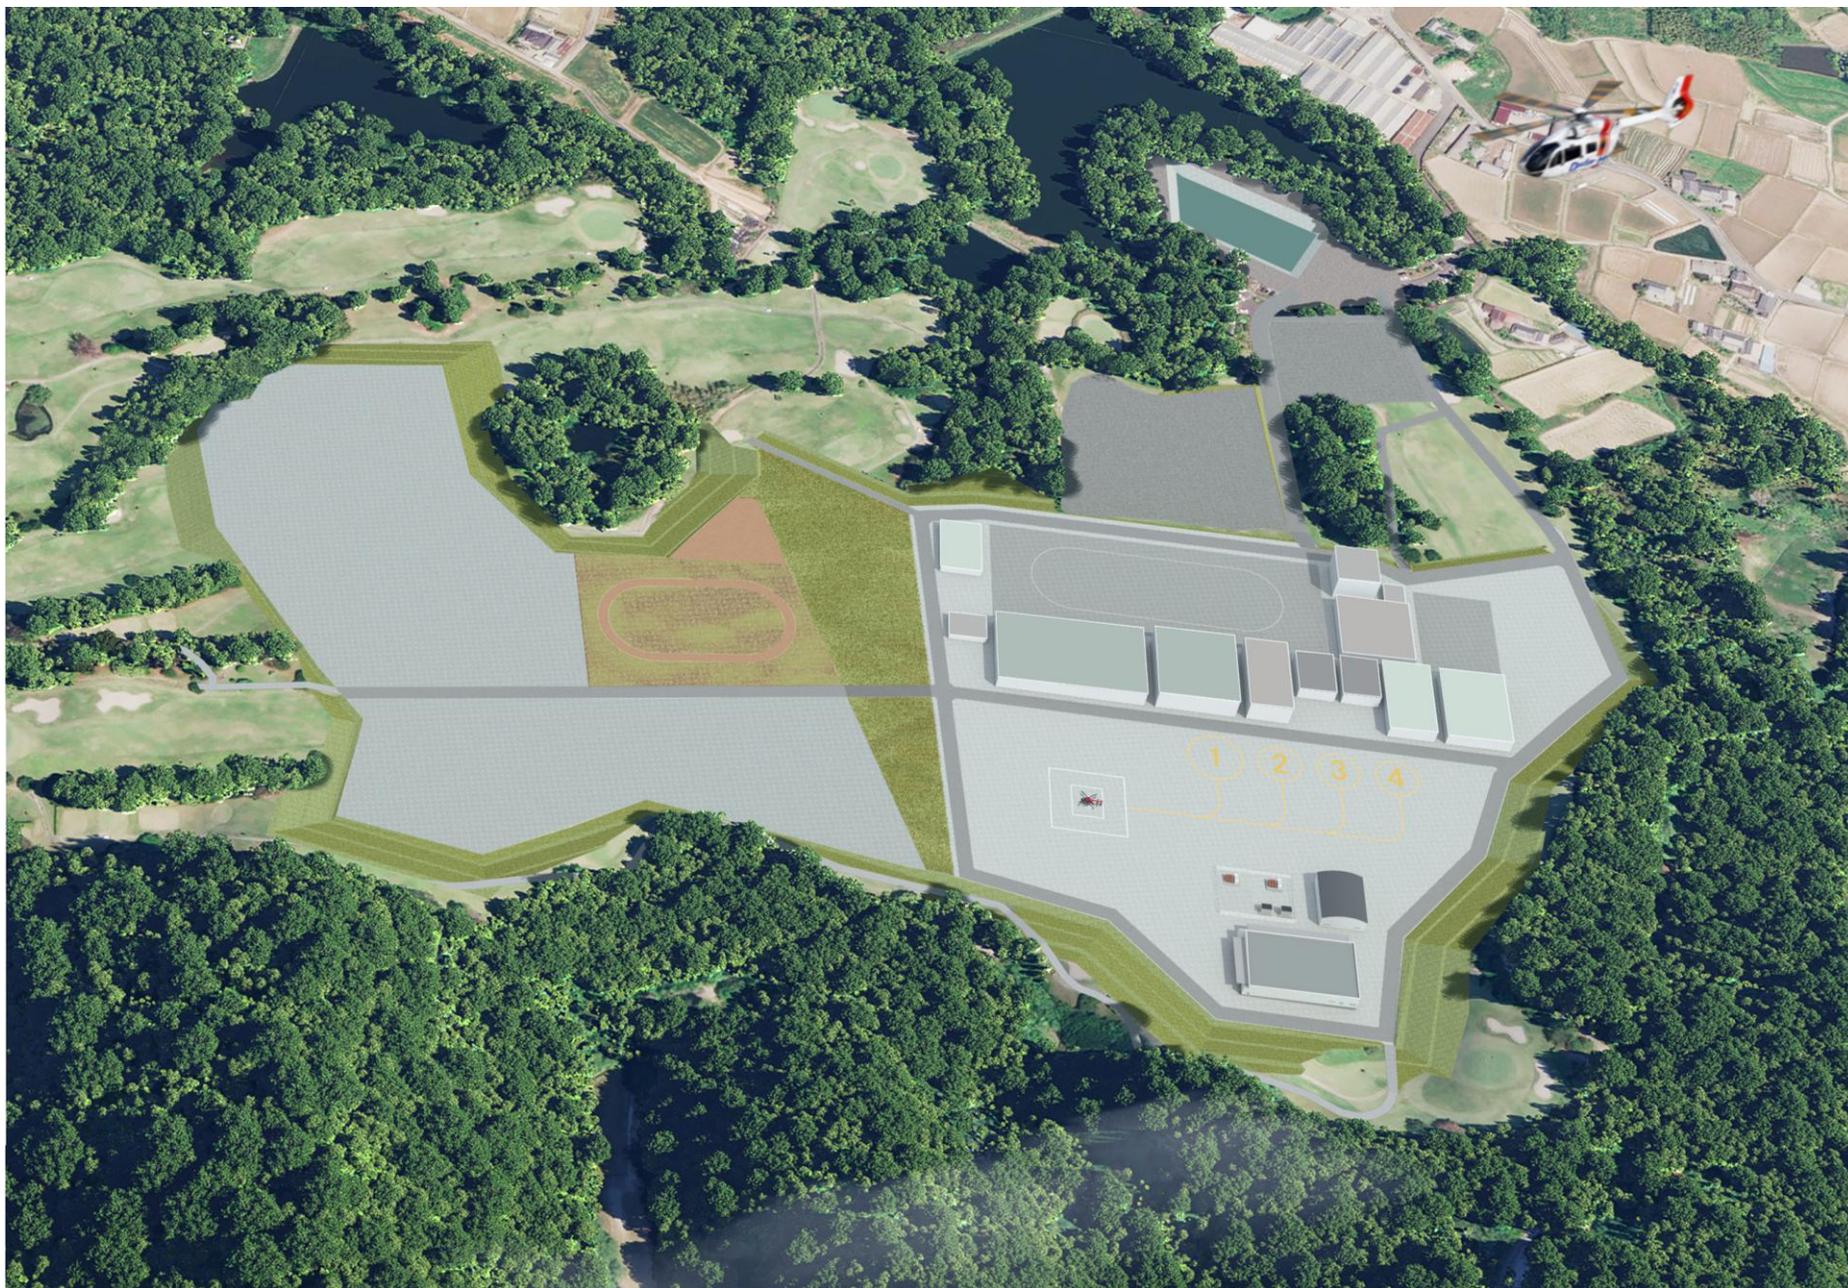

5. 整備スケジュール

- 第2段階(コアゾーン整備)は、令和16年度の完了を目指す。
- STEP3の道路整備および第3段階の支援ゾーン整備は、平常時の活用の検討を踏まえて、整備方針を検討する予定。

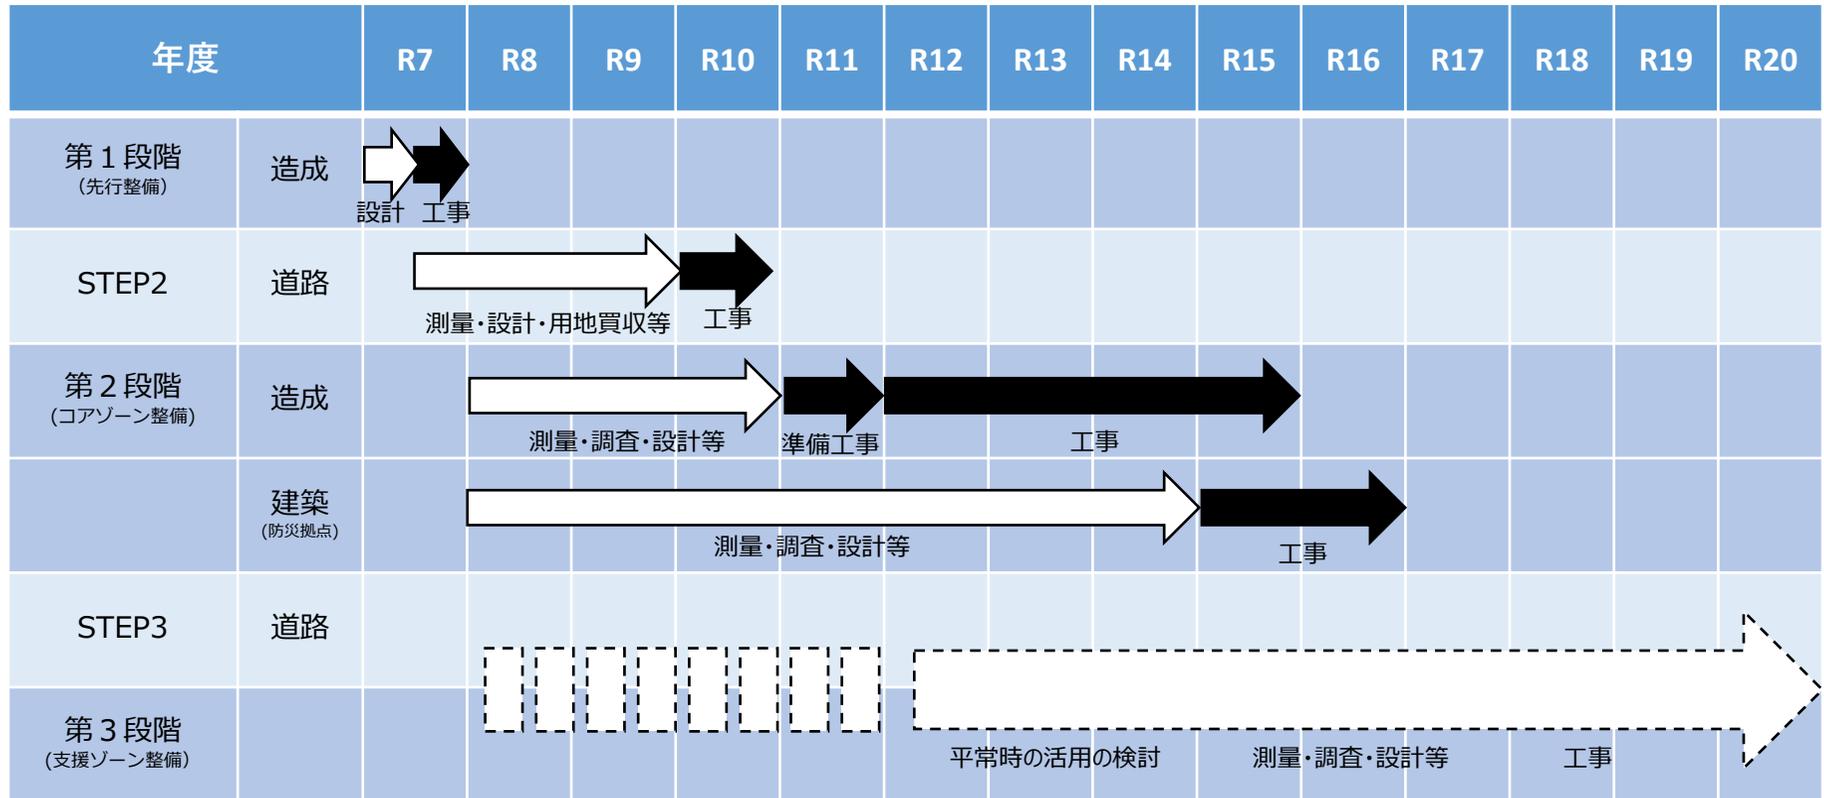

※用地買収の状況によりスケジュールが変動する可能性あり
