

令和 6 年度 第 2 回 奈良県公共事業評価監視委員会

〔事業再評価〕（前回評価：令和元年）

再評価実施理由：事業採択後長期間（5年間）が経過した時点で継続中の事業

【修正報告】

（令和 6 年度 第 1 回 奈良県公共事業評価監視委員会 審議分）

# 県営林道開設事業 林道殿野坪内線

令和 7 年 1 月 2 7 日

奈良県環境森林部


県産材利用推進課

# 1. 前回委員会での指摘事項とその対応

指摘事項	対応	ページ
事業が何故遅れているのか、といった観点について。「どのような原因があり、今後どのように順調に進むのか？」に係る説明を補足し、資料の充実を図ること。	説明文に追記しました。	P10

# 5. 事業の進捗の見込みの視点

- 平成23年度紀伊半島大水害により、天川側の起点付近において大規模な山腹崩壊が発生し、**大量の土砂により林道が埋没するとともに、その先でも複数箇所において既設林道区間が被災。大規模崩壊について林野庁の民有林直轄治山事業により復旧中であり、令和元年度からの5年間は天川側の事業が進捗しなかった。**
- **直轄治山事業の進捗に伴い、一部通行可能期間を設けることができたことで、その先の被災箇所は復旧した。令和8年度の当該治山事業の工事完了後は、通行規制がなくなることから、天川側の林道開設工事が再開できることとなり、五條側と併せて進捗が向上する見込み。**
- **さらに今後は施工条件の良い尾根部での工事となることも、事業進捗向上の要素となる。**
- **引き続き事業を推進し、令和12年度の事業完了を目指す。**

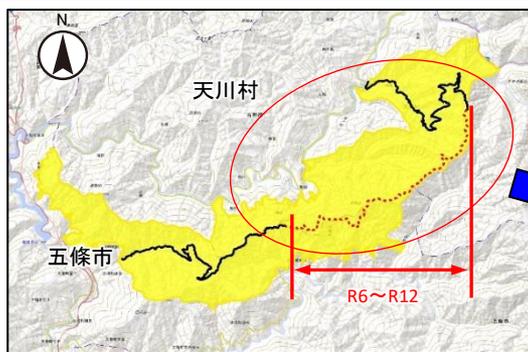

林野庁直轄治山事業  
(天川村坪内地区)



平成24年度より事業開始、  
令和8年度完了見込み

前回計画  
事業期間 H8~R12  
全体延長 25,551m  
全体事業費 3,027,000千円



今回計画(変更なし)  
事業期間 H8~R12  
全体延長 25,551m  
全体事業費 3,027,000千円




- 凡例
- ..... 殿野坪内線(残計画)
  - 殿野坪内線(既設)
  - 県道
  - 既設林道
  - 利用区域

出典:国土地理院「基盤地図情報」

# 5. 事業の進捗の見込みの視点

## 変更前(参考)


- 天川側起点において、平成23年度紀伊半島大水害により大規模な山腹崩壊が発生し、既設林道区間が被災。林野庁の民有林直轄治山事業により復旧中。令和元年度からの5年間はこれにより事業が進捗しなかった。
- 当該治山事業が令和8年度に完了予定なので、事業の進捗が改善する見込み。
- 引き続き事業を推進し、令和12年度の事業完了を目指す。

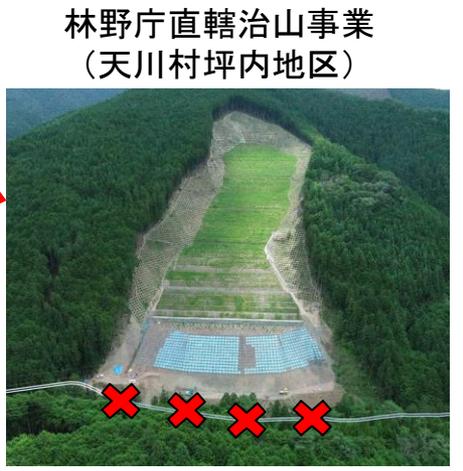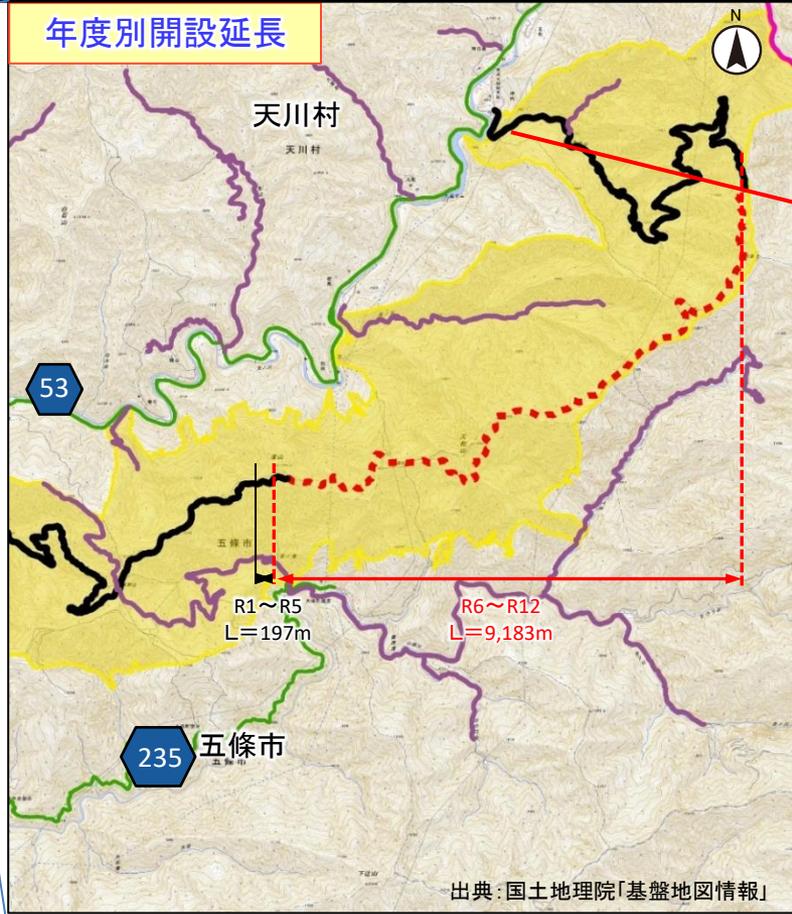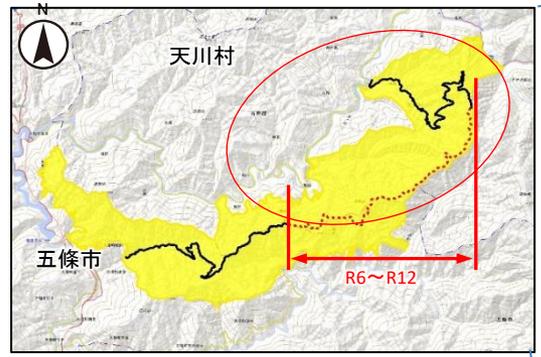

平成24年度より事業開始、令和8年度完了見込み

前回計画

事業期間 H8~R12  
全体延長 25,551m  
全体事業費 3,027,000千円



今回計画(変更なし)

事業期間 H8~R12  
全体延長 25,551m  
全体事業費 3,027,000千円

- 凡例
- ..... 殿野坪内線(残計画)
  - 殿野坪内線(既設)
  - 県道
  - 既設林道
  - 利用区域
